


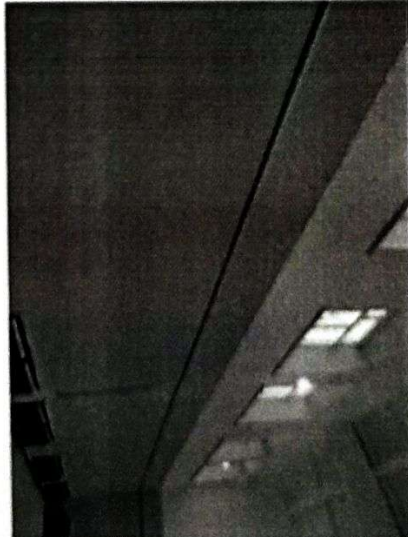


КГУ «Заринская СОШ»  
 Директор школы.  
*Жанкаринова Г.А.*  
 Жанкаринова Г.А.

**Информация**

по текущей ситуации строительных работ, капитальных ремонтов по государственными программам  
 по Павлодарскому району  
 по состоянию на 1 сентября 2021 года

№ п/п	Наименование проекта, местонахождения, стоимость	Начало и завершение работ по договору	Фактически Присутили, подрядчик	Текущая ситуация	Фото не менее 4-х
1	Капитальный ремонт КГУ «Заринская СОШ», с.Заря, Павлодарский район	от 18 марта 2021года по 1 августа 2021 года, было отпрвлено уведомление о просрочки 19 августа 2021 года	1 июня 2021 года, ТОО «Компания Стройиндустрия»	<p>«Ауыл – ел беслігі»</p> <p>Замена электропроводки – 100 %, замена светильников – 100%. Замена железных дверей 12 штук – 100%, установка дверей деревянных 1-го этажа – 100%; установка дверей деревянный 2-го этажа – 100%. Демонтаж и монтаж полов коридора 1-2 этажей – 100 %, Ремонт столовой, произвели замену кафели на 100% Покраска стен 100%. Установка дверных откосов 100%. Установка плинтуса из керамизгранитных плит – 100%. Установка покрытий</p>	

					<p>керамогранитной плитки лестничных маршей и площадок (3шт) – 100%. Установка покрытий входной группы из керамогранитной плитки – 100%.</p>	
